

INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GESTION - 2015

Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura

Ing. Víctor Federico Mireles Mamani



INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GESTION - 2015

PROYECTOS EJECUTADOS 2011 - 2014

INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GESTION - 2015

PROYECTOS EJECUTADOS POR LA GDTI 2011 - 2014

| AÑO | NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA | CODIGO SNIP | PRESUPUESTO EJECUTADO (S/.) | | | | | MODALIDAD DE EJECUCION | ESTADO SITUACIONAL | OBSERVACIONES |
|-----|--|-------------|-----------------------------|------|------|------|-------|------------------------|--------------------|---------------|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | TOTAL | | | |

INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-----------|---------|---------|-----------|--------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 2013 | SISTEMA DE RIEGO AURORA | --- 0 --- | 532,044 | 206,997 | 173,549 | 31,580 | 944,170.00 | ADM. DIRECTA | CONCLUIDA | CON INFORME FINAL |
| 2014 | SISTEMA DE RIEGO PIÑAPA | --- 0 --- | 1,377,995 | 65,258 | 20,888 | | 1,464,141.00 | ADM. DIRECTA | CONCLUIDA | PRUEBA HIDRAULICA PENDIENTE |
| | SISTEMA DE RIEGO SITANA | --- 0 --- | 89,355 | 69,451 | 50,232 | 118,877 | 327,915.00 | ADM. DIRECTA | PARALIZADA | YA SE COMPRO EL TERRENO |
| | CONSTRUCCION DE DRENES Y RECUPERACION DE TIERRAS AGRICOLAS DEL VALLE DE LOCUMBA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA | 116731 | | 57,933 | 3,913 | 773,734 | 835,580.00 | ADM. DIRECTA | EN EJECUCION | |
| | MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO VANEGAS – COLPAR – RETAMAL EN EL CASERÍO DE SOLABAYA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA | 164007 | | 23,478 | | 723,762 | 747,240.00 | ADM. DIRECTA | CONCLUIDA | CON INFORME FINAL |
| | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LOS CANALES SAGOLLO Y MALPASO, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE | 120854 | 1,404,216 | 40,933 | 6,480 | 6,428 | 1,458,057.00 | MIXTA | CONCLUIDA | CON INFORME FINAL |
| | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CANAL CHAUCALANA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE | 118261 | 1,626,150 | 3,671 | 4,193 | 12,813 | 1,646,827.00 | MIXTA | CONCLUIDA | CON INFORME FINAL |
| | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LOS CANALES SOJATA Y PEDREGAL ,DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE | 120259 | 972,622 | 20,623 | 10,072 | 10,076 | 1,013,393.00 | MIXTA | EN ARBITRAJE | |
| MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LOS MARGARATA Y HUANCARANE, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE | 118262 | 50,640 | | 3,282 | 30,163 | 84,085.00 | MIXTA | CONCLUIDA | CON INFORME FINAL | |

INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GESTION - 2015

PROYECTOS EJECUTADOS POR LA GDTI 2011 - 2014

| AÑO | NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA | CODIGO SNIP | PRESUPUESTO EJECUTADO (S/.) | | | | | MODALIDAD DE EJECUCION | ESTADO SITUACIONAL | OBSERVACIONES |
|--------------------|---|-------------|-----------------------------|---------|---------|--------|--------------|------------------------|--------------------|-------------------------|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | TOTAL | | | |
| 2014 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LOS CANALES VALDIVIA, PIÑAPA ALTA Y PIÑAPA BAJA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROV. DE JORGE BASADRE - TACNA | 118264 | 71,676 | 668 | 3,679 | 17,239 | 93,262.00 | MIXTA | CONCLUIDA | CON INFORME FINAL |
| | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CANAL SITANA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA | 118263 | 533,261 | 803 | 4,192 | 6,429 | 544,685.00 | MIXTA | CONCLUIDA | CON INFORME FINAL |
| | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CANAL CAPILLA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA | 129704 | 152,414 | 57,309 | 3,832 | | 213,555.00 | MIXTA | CONCLUIDA | CON INFORME FINAL |
| SANEAMIENTO | | | | | | | | | | |
| 2011 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PILETAS, LETRINAS EN EL SECTOR URBANO LA AURORA EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE | 133079 | 23,359 | | | | 23,359.00 | CONTRATA | CONCLUIDA | LIQUIDACIÓN DE CONTRATO |
| | MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL PUEBLO TRADICIONAL VILLA LOCUMBA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE | 149526 | 1,508,769 | 66,735 | 1,881 | | 1,577,385.00 | CONTRATA | CONCLUIDA | LIQUIDACIÓN DE CONTRATO |
| 2012 | INSTALACION Y AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN EL ANEXO CHIPE - SECTOR PEDREGAL | 151732 | 72,569 | 576,826 | 60,811 | | 710,206.00 | ADM. DIRECTA | CONCLUIDA | CON INFORME FINAL |
| 2013 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ANEXO DE PIÑAPA DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA | 133169 | 321,171 | 162,470 | 128,192 | 230 | 612,063.00 | ADM. DIRECTA | CONCLUIDA | CON INFORME FINAL |

INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GESTION - 2015

PROYECTOS EJECUTADOS POR LA GDTI 2011 - 2014

| AÑO | NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA | CODIGO SNIP | PRESUPUESTO EJECUTADO (S/.) | | | | | MODALIDAD DE EJECUCION | ESTADO SITUACIONAL | OBSERVACIONES | |
|------|--|-------------|-----------------------------|-----------|---------|-----------|-------|------------------------|--------------------|---------------|------------------------------------|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | TOTAL | | | | |
| 2013 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN EL AA.HH. PAMPA SITANA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA | 133983 | 1,752,754 | 1,089,119 | | | | 2,841,873.00 | ADM. DIRECTA | CONCLUIDA | CON INFORME FINAL |
| | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ASENTAMIENTO HUMANO PUENTE CAMIARA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA | 77061 | | 87,303 | 486,740 | 377,408 | | 951,451.00 | ADM. DIRECTA | PARALIZADA | ADICIONAL EN TRAMITE |
| | INSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA JARDIN, DISTRITO DE ITE, PROVINCIA JORGE BASADRE TACNA | 161361 | | | | 234 | | 234.00 | POR CONTRATA | EN EJECUCION | ENTREGA DE TERRENO DIA 26.DIC.2014 |
| | RED DE AGUA POTABLE ALTO CAMIARA - PAMPA SITANA | --- 0 --- | | 101,020 | 433,778 | 333,022 | | 867,820.00 | ADM. DIRECTA | CONCLUIDA | CON INFORME FINAL |
| | RED DE AGUA POTABLE ALTO CAMIARA | --- 0 --- | 143,953 | 11,259 | 267,353 | 129,344 | | 551,909.00 | ADM. DIRECTA | CONCLUIDA | CON INFORME FINAL |
| 2014 | INSTALACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO EN EL ANEXO DE CHIPE, SECTOR TRAPICHE, DEL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA | 165595 | 6,884 | 7,074 | 942 | 177,945 | | 192,845.00 | ADM. DIRECTA | CONCLUIDA | CON INFORME FINAL |
| | INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ANEXO DE CHAUCALANA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE – TACNA | 76941 | | 10,400 | 3,786 | 627,453 | | 641,639.00 | ADM. DIRECTA | CONCLUIDA | CON INFORME FINAL |
| | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VIÑAS DEL SUR Y EL ASENTAMIENTO HUMANO URBANIZACIÓN NUEVO LOCUMBA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE – TACNA | 156243 | | | 83,383 | 1,594,505 | | 1,677,888.00 | CONTRATA | CONCLUIDA | LIQUIDACIÓN DE CONTRATO |

INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GESTION - 2015

PROYECTOS EJECUTADOS POR LA GDTI 2011 - 2014

| AÑO | NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA | CODIGO SNIP | PRESUPUESTO EJECUTADO (S./) | | | | | MODALIDAD DE EJECUCION | ESTADO SITUACIONAL | OBSERVACIONES |
|-----|--|-------------|-----------------------------|------|------|------|-------|------------------------|--------------------|---------------|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | TOTAL | | | |

ELECTRIFICACIONES

| | | | | | | | | | | |
|------|--|--------|--|---------|--|---------|-------------------|----------|-----------|------------------------------------|
| 2012 | AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL ANEXO DE PIÑAPA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA | 135150 | | 263,568 | | | 263,568.00 | CONTRATA | CONCLUIDA | LIQUIDACIÓN DE CONTRATO |
| | AMPLIACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN 10 KV, SUBESTACION Y CONSTRUCCION DEL SUBSISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VIÑAS DEL SUR, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA | 158739 | | 315,549 | | | 315,549.00 | CONTRATA | CONCLUIDA | LIQUIDACIÓN DE CONTRATO |
| 2013 | EJECUCION DE COMPONENTE 01: DOTACION DE ENERGIA TRIFASICA de la Obra Mejoramiento de la Dotación de Agua Para Riego en el Valle de Cinto, Distrito de Locumba, Provincia Jorge Basadre - Tacna | 129655 | | 1,674 | | | 1,674.00 | CONTRATA | CONCLUIDA | LIQUIDACIÓN DE CONTRATO EN PROCESO |
| 2014 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN EL SECTOR ALTO CAMIARA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE – TACNA | 248994 | | | | 303,474 | 303,474.00 | CONTRATA | CONCLUIDA | LIQUIDACIÓN DE CONTRATO EN PROCESO |
| | INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA RED PRIMARIA EN LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES 5 ESTRELLAS, DISTRITO DE ITE, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA | 171913 | | 2,639 | | 24,402 | 27,041.00 | CONTRATA | CONCLUIDA | LIQUIDACIÓN DE CONTRATO |

PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO

| | | | | | | | | | | |
|------|--|--------|--|---------|--|--|-------------------|--------------|-----------|-----------|
| 2011 | FORT. DEL PUESTO POLICIAL EN LA VILLA LOCUMBA | 133073 | | | | | 0.00 | ADM. DIRECTA | CONCLUIDA | LIQUIDADA |
| 2012 | MEJ. DE LAS CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL DISTRITO DE LOCUMBA | 72433 | | 516,771 | | | 516,771.00 | ADM. DIRECTA | CONCLUIDA | LIQUIDADA |
| 2013 | FORT. SERVICIO DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS JORGE BASADRE N° 137 | 43509 | | | | | 0.00 | ADM. DIRECTA | CONCLUIDA | LIQUIDADA |

INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GESTION - 2015

PROYECTOS EJECUTADOS POR LA GDTI 2011 - 2014

| AÑO | NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA | CODIGO SNIP | PRESUPUESTO EJECUTADO (S/.) | | | | | MODALIDAD DE EJECUCION | ESTADO SITUACIONAL | OBSERVACIONES |
|----------------------------------|---|-------------|-----------------------------|--------|--------|---------|--------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | TOTAL | | | |
| 2014 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS DE LA SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y TRANSPORTE DE LA MUNICIPALIDAD DE JORGE BASADRE, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA | 245318 | | | | 707,371 | 707,371.00 | ADM. DIRECTA | CONCLUIDA | CON INFORME FINAL |
| INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | | | | | | | | | | |
| | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. NUESTRO SEÑOR DE LOCUMBA, NIVEL SECUNDARIO EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA | 135640 | 1,618,539 | 63,788 | 9,396 | | 1,691,723.00 | MIXTA | CONCLUIDA | LIQUIDADADA |
| | CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE I.E. PRIMARIA N° 42056 ANEXO DE SAGOLLO, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA | 71091 | 536,131 | 1,667 | 76,300 | 2,526 | 616,624.00 | MIXTA | CONCLUIDA | LIQUIDADADA |
| 2011 | CONST. E IMPLEMENT. I.E. PRIMARIA N° 42057 ANEXO DE CHIPE, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA | 69694 | 145,348 | 367 | 4,700 | 13,439 | 163,854.00 | MIXTA | CONCLUIDA | CON INFORME FINAL |
| | CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA I.E.I. N° 379 ANEXO DE CHIPE, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA | 69695 | 385,239 | 803 | | 9,919 | 395,961.00 | MIXTA | CONCLUIDA | CON INFORME FINAL |
| | CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 375 ANEXO ALTO CAMIARA DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA | 96425 | 40,398 | 804 | | 8,589 | 49,791.00 | MIXTA | CONCLUIDA | LIQUIDADADA |
| | CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N°42252, ANEXO DE CINTO, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA | 69696 | 290,856 | 2,126 | | | 292,982.00 | MIXTA | CONCLUIDA | CON INFORME FINAL |

INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GESTION - 2015

PROYECTOS EJECUTADOS POR LA GDTI 2011 - 2014

| AÑO | NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA | CODIGO SNIP | PRESUPUESTO EJECUTADO (S/.) | | | | | MODALIDAD DE EJECUCION | ESTADO SITUACIONAL | OBSERVACIONES |
|------|---|-------------|-----------------------------|--------|--------|-----------|---------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | TOTAL | | | |
| 2011 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA JOSE CARLOS VALDIVIA FIGUEROA, Nº 42233 ANEXO DE ALTO CAMIARA, DISTRITO DE LOCUMBA | 70260 | 228,935 | 15,525 | 2,123 | | 246,583.00 | MIXTA | CONCLUIDA | CON INFORME FINAL |
| | MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 42262 SITANA ANEXO PAMPA SITANA, DISTRITO DE LOCUMBA | 70308 | 1,206,133 | 21,254 | 3,669 | | 1,231,056.00 | MIXTA | CONCLUIDA | LIQUIDADADA |
| | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LA I.E.I. Nº 403 PUENTE CAMIARA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA | 91756 | | 7,969 | 28,261 | 7,231 | 43,461.00 | MIXTA | CONCLUIDA | CON INFORME FINAL |
| 2014 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. Nº231 VILLA LOCUMBA EN LOCUMBA CAPITAL, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE – TACNA | 275023 | | | | 2,547,311 | 2,547,311.00 | CONTRATA | CONCLUIDA | PARA RECEPCION DE OBRA |

RECREACION Y CULTURA

| | | | | | | | | | | |
|------|---|--------|---------|--------|--|-------|-------------------|--------------|-----------|-------------------------|
| 2011 | MEJ. DEL PARQUE RECREATIVO INFANTIL EN EL ANEXO DE CHIPE - PEDREGAL | | | | | | | ADM. DIRECTA | CONCLUIDA | LIQUIDADADA |
| | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA DEL ANEXO DE SAGOLLO DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA | 107768 | 152,348 | 5,089 | | | 157,437.00 | ADM. DIRECTA | CONCLUIDA | LIQUIDADADA |
| | MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO INFANTIL EN EL AA.HH. DE PUENTE CAMIARA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA | 108808 | 31,278 | 2,402 | | 6,546 | 40,226.00 | ADM. DIRECTA | CONCLUIDA | CON INFORME FINAL |
| | CONSTRUCCION DEL LOCAL COMUNAL ASOCIACION HEROES DE MIRAVE EN EL CP MIRAVE, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA | 114637 | 44,982 | 5,305 | | | 50,287.00 | ADM. DIRECTA | CONCLUIDA | LIQUIDADADA |
| | CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LOCAL MULTUSOS EN EL ANEXO DE ALTO CAMIARA DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA | 114846 | 42,074 | | | | 42,074.00 | CONTRATA | CONCLUIDA | LIQUIDACIÓN DE CONTRATO |
| | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO LOCAL DE USOS MULTIPLES EN EL ANEXO DE VILALACA | 104906 | 21,116 | 20,801 | | | 41,917.00 | MIXTA | CONCLUIDA | LIQUIDADADA |

INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GESTION - 2015

PROYECTOS EJECUTADOS POR LA GDTI 2011 - 2014

| AÑO | NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA | CODIGO SNIP | PRESUPUESTO EJECUTADO (S/.) | | | | | MODALIDAD DE EJECUCION | ESTADO SITUACIONAL | OBSERVACIONES |
|------|---|-------------|-----------------------------|-----------|--------|-------|---------------------|------------------------|--------------------|---------------|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | TOTAL | | | |
| 2012 | MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA Y JUEGOS INFANTILES EN EL ANEXO DE PAMPA SITANA, DISTRITO DE LOCUMBA PROV. JORGE BASADRE - TACNA | 106220 | 20,830 | 1,003,139 | 69,485 | | 1,093,454.00 | ADM. DIRECTA | CONCLUIDA | LIQUIDADADA |
| | CONSTRUCCION DE PARQUE SECTORIAL EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA URBANIZACION VILLA MUNICIPAL, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA | 165099 | | 129,662 | | | 129,662.00 | ADM. DIRECTA | CONCLUIDA | LIQUIDADADA |
| | RECONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA VILLA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA | 156727 | 48,874 | 513,919 | 16,840 | | 579,633.00 | ADM. DIRECTA | CONCLUIDA | LIQUIDADADA |
| | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EL ANEXO DE ALTO CAMIARA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA | 157125 | 40,815 | 353,129 | 9,977 | | 403,921.00 | ADM. DIRECTA | CONCLUIDA | LIQUIDADADA |
| | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EL A.H. PIÑAPA, DISTRITO D LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA | 140547 | 6,635 | 517,802 | 5,515 | | 529,952.00 | ADM. DIRECTA | CONCLUIDA | LIQUIDADADA |
| | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EL A.H. PAMPA SITANA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA | 158898 | 21,349 | 1,507,006 | 36,493 | 5,500 | 1,570,348.00 | ADM. DIRECTA | CONCLUIDA | LIQUIDADADA |
| | CONSTRUCCION DE LOCAL MULTIUSOS EN LA URBANIZACION NUEVO LOCUMBA DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA | 158359 | | 585,022 | 27,004 | | 612,026.00 | CONTRATA | CONCLUIDA | LIQUIDADADA |
| | RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL LOCAL CLUB DE MADRES CORAZON DE MARIA EN EL CENTRO POBLADO DE BOROGUEÑA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA | 168119 | 31,967 | 241,418 | 19,999 | | 293,384.00 | ADM. DIRECTA | CONCLUIDA | LIQUIDADADA |

INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GESTION - 2015

PROYECTOS EJECUTADOS POR LA GDTI 2011 - 2014

| AÑO | NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA | CODIGO SNIP | PRESUPUESTO EJECUTADO (S/.) | | | | | MODALIDAD DE EJECUCION | ESTADO SITUACIONAL | OBSERVACIONES |
|------|---|-------------|-----------------------------|---------|-----------|---------|--------------|------------------------|--------------------|-------------------------|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | TOTAL | | | |
| 2013 | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA DE ENLACE MUNICIPAL EN EL AREA DE ALTO CAMIARA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA | 164976 | | 15,211 | 383,907 | 867 | 399,985.00 | ADM. DIRECTA | CONCLUIDA | CON INFORME FINAL |
| | CREACION DEL LOCAL DE USOS MLTIPLS EN EL ANEXO DE CINTO, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA | 199385 | | 225,303 | | 683 | 225,986.00 | ADM. DIRECTA | CONCLUIDA | CON INFORME FINAL |
| | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL COMUNAL DE USOS MULTIPLES EN EL A.H. DE PIÑAPA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA | 166918 | 7,403 | 326,531 | 293,068 | | 627,002.00 | ADM. DIRECTA | CONCLUIDA | LIQUIDADADA |
| | CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL MULTIUSOS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VIÑAS DEL SUR, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA | 159472 | 7,500 | 167,749 | 272,249 | 914 | 448,412.00 | ADM. DIRECTA | CONCLUIDA | CON INFORME FINAL |
| | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL SALÓN COMUNAL DE USOS MÚLTIPLES EN EL A. H. DE PAMPA SITANA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA | 122187 | | 14,140 | 734,411 | 5,193 | 753,744.00 | CONTRATA | CONCLUIDA | LIQUIDACIÓN DE CONTRATO |
| | CREACION DEL PARQUE RECREATIVO INFANTIL EN EL A.H. PIÑAPA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA | 141264 | | 8,503 | | 4,470 | 12,973.00 | ADM. DIRECTA | CONCLUIDA | CON INFORME FINAL |
| 2014 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DEL CENTRO POBLADO BOROGUEÑA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA | 218023 | | 42,876 | 1,032,156 | 236,685 | 1,311,717.00 | ADM. DIRECTA | PARALIZADA | RESOLUCION DE CONTRATO |
| | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS SOCIALES PARTICIPATIVOS EN EL CENTRO POBLADO DE BOROGUEÑA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA | 239972 | | | | 660,279 | 660,279.00 | ADM. DIRECTA | EN EJECUCION | |

INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GESTION - 2015

PROYECTOS EJECUTADOS POR LA GDTI 2011 - 2014

| AÑO | NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA | CODIGO SNIP | PRESUPUESTO EJECUTADO (S.) | | | | | MODALIDAD DE EJECUCION | ESTADO SITUACIONAL | OBSERVACIONES |
|------|---|-------------|----------------------------|--------|---------|-----------|--------------|------------------------|--------------------|------------------------------------|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | TOTAL | | | |
| 2014 | MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CÍVICA PRINCIPAL JORGE BASADRE GROHMAN EN EL CENTRO POBLADO DE BOROGUEÑA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA | 217968 | | 9,419 | 739 | 477,626 | 487,784.00 | ADM. DIRECTA | EN EJECUCION | |
| | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DE LA LOSA DEPORTIVA DEL ANEXO DE ALTO CAMIARA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA | 268119 | | | | 555,163 | 555,163.00 | ADM. DIRECTA | EN EJECUCION | |
| | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE RECREACIÓN PASIVA Y CULTURAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LAS VILCAS, DISTRITO DE ITE, PROVINCIA JORGE BASADRE TACNA (ING. EDUARDO CUELLAR) | 290476 | | | | 565,750 | 565,750.00 | ADM. DIRECTA | EN EJECUCION | |
| | AMPLIACION DEL COMEDOR POPULAR VIRGEN DE COPACABANA EN EL C.P. CAMBAYA - DISTRITO DE ILABAYA | 135836 | | | | 150,587 | 150,587.00 | ADM. DIRECTA | EN EJECUCION | |
| | CREACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS SOCIALES PARTICIPATIVOS EN EL ANEXO DE PUENTE CAMIARA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE-TACNA | 227127 | | 23,042 | | 368,797 | 391,839.00 | ADM. DIRECTA | CONCLUIDA | CON INFORME FINAL |
| | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS SOCIALES PARTICIPATIVOS DEL SECTOR PEDREGAL, ANEXO DE CHIPE, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE-TACNA | 225391 | | 29,737 | | 720,171 | 749,908.00 | ADM. DIRECTA | CONCLUIDA | CON INFORME FINAL |
| | CONSTRUCCIÓN DE LA LOSA DEPORTIVA Y PARQUE RECREATIVO INFANTIL EN LA URB. NUEVO LOCUMBA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA | 133392 | | 10,154 | 748,869 | 221,918 | 980,941.00 | ADM. DIRECTA | CONCLUIDA | CON INFORME FINAL |
| | MEJORAMIENTO DE PLAZA CÍVICA EN VILLA EL EDÉN, DISTRITO DE ITE, PROVINCIA JORGE BASADRE – TACNA | 171186 | | | | 1,103,737 | 1,103,737.00 | CONTRATA | CONCLUIDA | LIQUIDACIÓN DE CONTRATO EN PROCESO |

INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GESTION - 2015

PROYECTOS EJECUTADOS POR LA GDTI 2011 - 2014

| AÑO | NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA | CODIGO SNIP | PRESUPUESTO EJECUTADO (S.) | | | | | MODALIDAD DE EJECUCION | ESTADO SITUACIONAL | OBSERVACIONES |
|-----|--|-------------|----------------------------|------|------|------|-------|------------------------|--------------------|---------------|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | TOTAL | | | |

INFRAESTRUCTURA VIAL

| | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|--------------|------------|---------------------------|
| 2013 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL AA.HH. PUENTE CAMIARA. DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA | 139931 | 64,057 | 1,185,188 | 778,909 | 31,578 | 2,059,732.00 | ADM. DIRECTA | CONCLUIDA | CON INFORME FINAL |
| | MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DE LA VILLA LOCUMBA, DISTRITO LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE | 151475 | | 559,941 | | 8,620 | 568,561.00 | CONTRATA | CONCLUIDA | LIQUIDACIÓN DE CONTRATO |
| 2014 | CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO PAMPA SITANA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA | 169833 | 75,354 | | 1,461,135 | 5,683,249 | 7,219,738.00 | CONTRATA | PARALIZADA | EN INTERVENCION ECONOMICA |
| | CONSTRUCCION CARRETERA LOCUMBA MARGARATA A NIVEL DE ASFALTADO | --- 0 --- | 1,052,623 | 4,545,239 | 9,417,084 | 519,419 | 15,534,365.00 | ADM. DIRECTA | CONCLUIDA | CON INFORME FINAL |

INFRAESTRUCTURA VARIAS


| | | | | | | | | | | |
|------|--|--------|---------|-----------|-----------|---------|---------------------|--------------|-----------|---------------------------------|
| 2011 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE LA INSTALACION DE UN GRUPO EECTROGENO PARA LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE - TACNA | 85313 | | 3,543 | | | 3,543.00 | CONTRATA | CONCLUIDA | CON INFORME FINAL |
| | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LOCAL DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA | 98856 | 291,611 | 56,122 | 1,844 | | 349,577.00 | ADM. DIRECTA | CONCLUIDA | CON INFORME FINAL |
| 2012 | MEJ. DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA - INFRAESTRUCTURA | 158002 | | 400,267 | | | 400,267.00 | ADM. DIRECTA | CONCLUIDA | SOLO COMPONENTE INFRAESTRUCTURA |
| 2013 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL Y PATRIMONIAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA | 73129 | | 3,277,355 | | 203,824 | 3,481,179.00 | CONTRATA | CONCLUIDA | LIQUIDADA |
| | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ALOJAMIENTO PARA EL PERSONAL DE OFICIALES, TECNICOS Y SUBOFICIALES DEL ESTADO MAYOR DE LA VI BRIGADA BLINDADA, DISTRITO DE ITE, PROV. JORGE BASADRE - TACNA | 156191 | | | 3'086,057 | 52,185 | 3'138,242.00 | CONTRATA | CONCLUIDA | LIQUIDADA |

INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GESTION - 2015

PROYECTOS EJECUTADOS POR LA GDTI 2011 - 2014

| AÑO | NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA | CODIGO SNIP | PRESUPUESTO EJECUTADO (S/.) | | | | | MODALIDAD DE EJECUCION | ESTADO SITUACIONAL | OBSERVACIONES |
|------|---|-------------|-----------------------------|------|------|---------|------------|------------------------|--------------------|------------------------------------|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | TOTAL | | | |
| 2014 | EJECUCION DE COMPONENTE 02: INSTALACION DE MOTORES ELECTRICOS Y MEJORAMIENTO DE POZOS Y TUBERIAS de la Obra Mejoramiento de la Dotación de Agua Para Riego en el Valle de Cinto, Distrito de Locumba, Provincia Jorge Basadre - Tacna | 129655 | | | | 707,371 | 707,371.00 | CONTRATA | CONCLUIDA | LIQUIDACIÓN DE CONTRATO EN PROCESO |
| | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL DISTRITO DE LOCUMBA DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA | 235535 | | | | 734,802 | 734,802.00 | ADM. DIRECTA | CONCLUIDA | CON INFORME FINAL |


| OBRAS | Nº |
|--------------|-----------|
| CONCLUIDAS | 72 |
| PARALIZADAS | 4 |
| EN ARBITRAJE | 1 |
| EN EJECUCION | 7 |
| TOTAL | 84 |

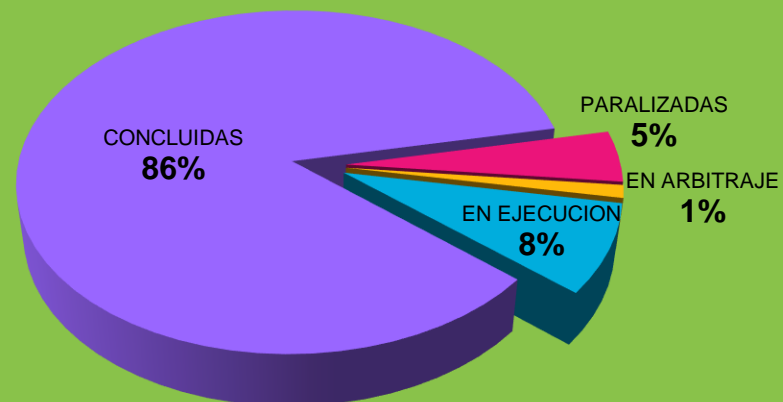

INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GESTION - 2015

CANTIDAD DE PROYECTOS POR FUNCION 2011 - 2014


| RUBRO | Nº DE OBRAS |
|------------------------------|-------------|
| INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | 12 |
| SANEAMIENTO | 12 |
| ELECTRIFICACIONES | 5 |
| PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO | 4 |
| INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 10 |
| RECREACION Y CULTURA | 30 |
| INFRAESTRUCTURA VIAL | 4 |
| INFRAESTRUCTURA VARIAS | 7 |
| TOTAL | 84 |

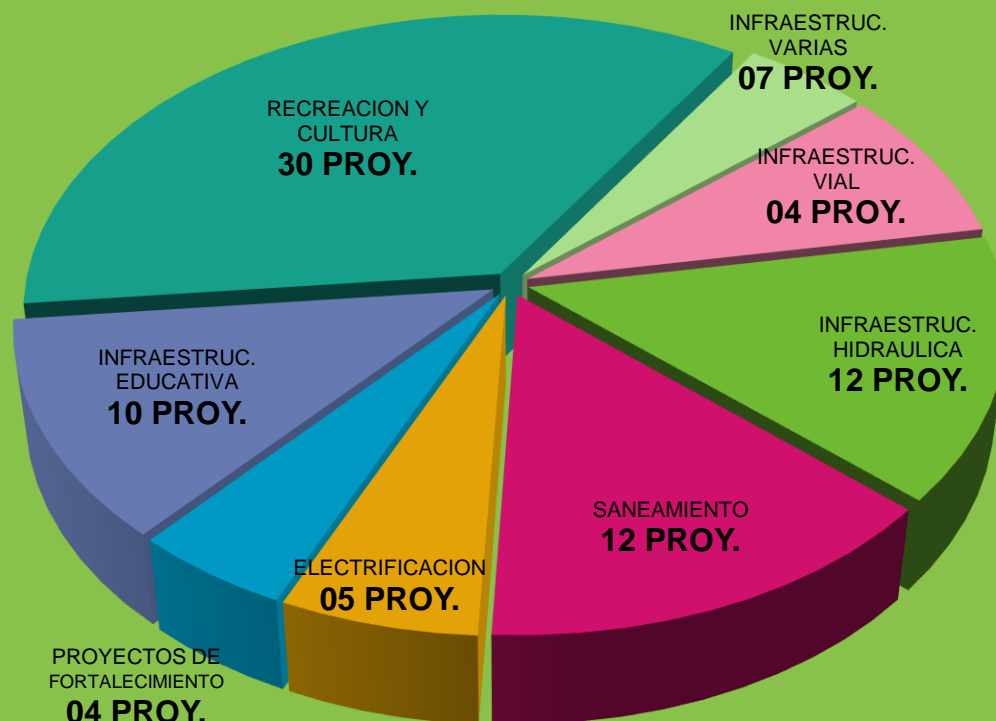

INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GESTION - 2015

INVERSION EJECUTADA POR LA GDTI POR FUNCION 2011 - 2014


| RUBRO | MONTO DE INVERSION S/. |
|------------------------------|------------------------|
| INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | 9,372,910.00 |
| SANEAMIENTO | 10,648,672.00 |
| ELECTRIFICACIONES | 911,306.00 |
| PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO | 1,224,142.00 |
| INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 7,279,346.00 |
| RECREACION Y CULTURA | 15,189,281.00 |
| INFRAESTRUCTURA VIAL | 25,382,396.00 |
| INFRAESTRUCTURA VARIAS | 8,814,981.00 |
| TOTAL S/. | 78,823,034.00 |

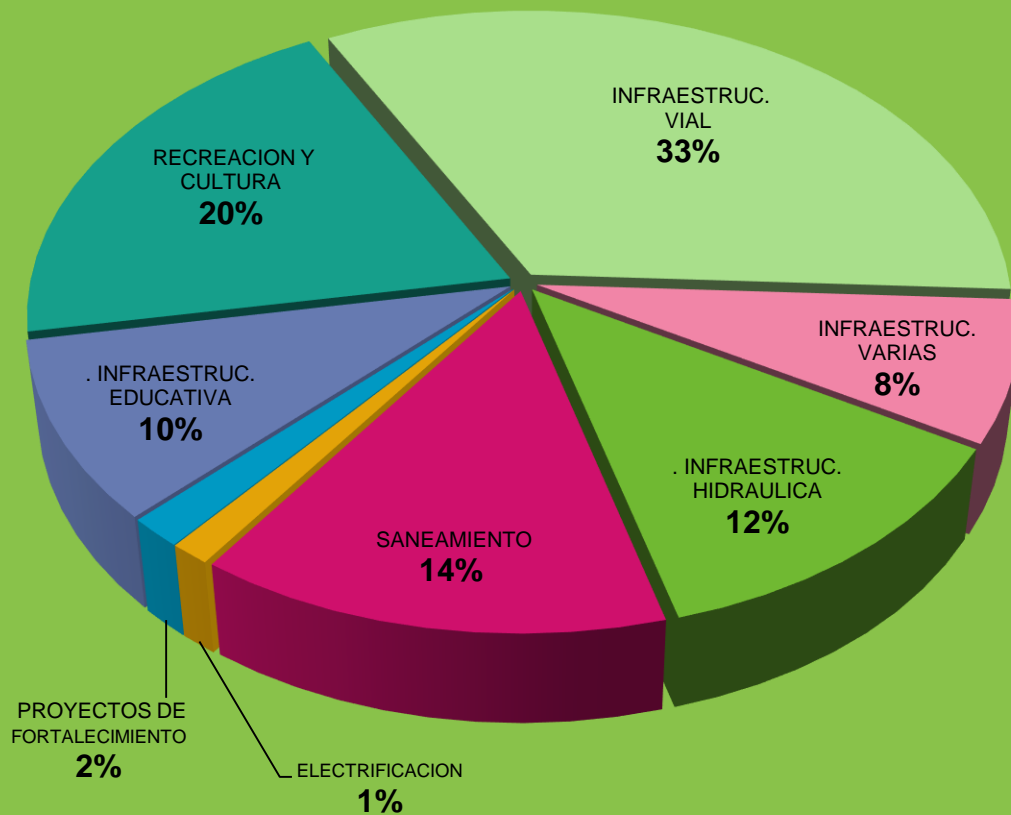

INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GESTION - 2015

INVERSION EJECUTADA POR LA GDTI POR AÑO 2011 - 2014

| AÑO | MONTO DE INVERSION S/. |
|------------------|---------------------------|
| 2011 | 17,266,898.00 |
| 2012 | 19,662,925.00 |
| 2013 | 20,271,773.00 |
| 2014 | 21,621,438.00 |
| TOTAL S/. | 78,823,034.00 |

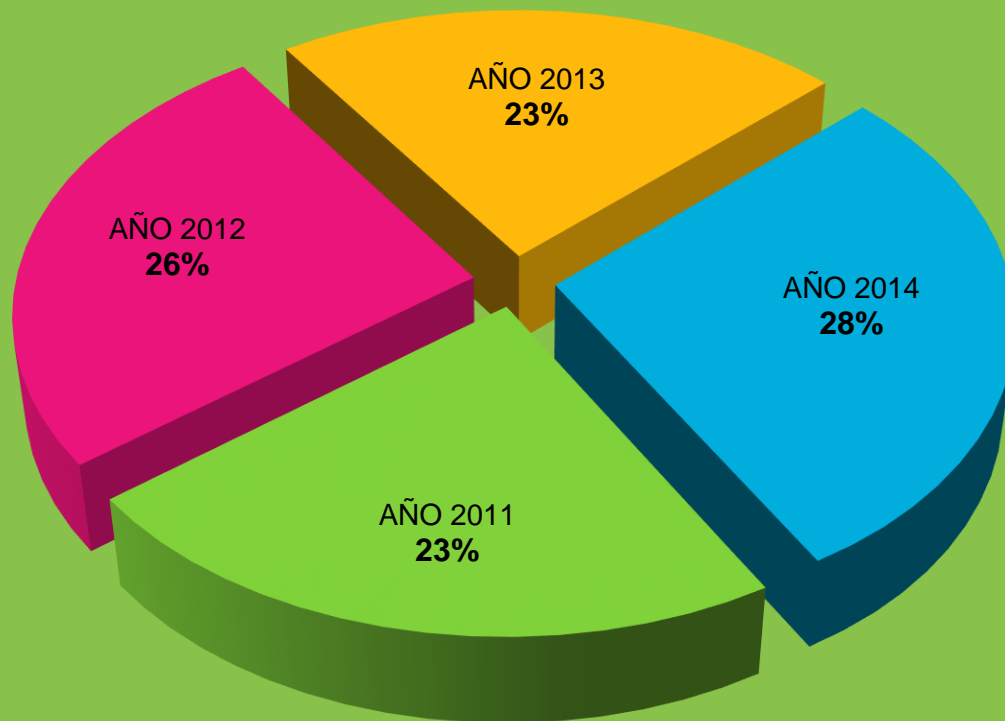

INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GESTION - 2015

PROYECTOS DE CONTINUIDAD

INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GESTION - 2015

DIAGNOSTICO

INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GESTION - 2015

PROYECTOS DE CONTINUIDAD


| Nº | NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA | CODIGO SNIP | PPTO. APROBADO | AVANCE FINANCIERO A DIC DEL 2014 | | AVANCE FISICO A DIC. DEL 2014 | MODALIDAD DE EJECUCION | ESTADO SITUACIONAL | OBSERVACIONES |
|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| | | | | PPTO. EJECUTADO | PPTO. POR EJECUTAR | | | | |
| INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | | | | | | | | | |
| 1 | SISTEMA DE RIEGO SITANA | --- 0 --- | 4,245,989.67 | 4,002,322.31 | 243,667.36 | 64.92% | ADM. DIRECTA | PARALIZADA | YA SE COMPRO EL TERRENO |
| 2 | CONSTRUCCION DE DRENES Y RECUPERACION DE TIERRAS AGRICOLAS DEL VALLE DE LOCUMBA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA | 116731 | 2,381,890.53 | 835,580.00 | 1,546,310.53 | 12.16% | ADM. DIRECTA | EN EJECUCION | |
| 3 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LOS CANALES SOJATA Y PEDREGAL, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE | 120259 | 1,896,851.77 | 1,867,835.86 | 29,015.91 | 98.00% | MIXTA | PARALIZADA | EN ARBITRAJE |
| SANEAMIENTO | | | | | | | | | |
| 4 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ASENTAMIENTO HUMANO PUENTE CAMIARA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA | 77061 | 2,375,689.09 | 2,354,461.87 | 21,227.22 | 100.00% | ADM. DIRECTA | PARALIZADA | ADICIONAL EN TRAMITE |
| 5 | INSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA JARDIN, DISTRITO DE ITE, PROVINCIA JORGE BASADRE TACNA | 161361 | 90,909.44 | 234.00 | 90,675.44 | 0.00% | POR CONTRATA | EN EJECUCION | ENTREGA DE TERRENO DIA 26.DIC.2014 |
| RECREACION Y CULTURA | | | | | | | | | |
| 6 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DEL CENTRO POBLADO BOROQUEÑA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA | 218023 | 1,375,521.00 | 1,311,717.00 | 63,804.00 | | POR CONTRATA | PARALIZADA | EN PROCESO DE RESOLUCION DE CONTRATO |

INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GESTION - 2015


PROYECTOS DE CONTINUIDAD

| Nº | NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA | CODIGO SNIP | PPTO. APROBADO | AVANCE FINANCIERO A DIC DEL 2014 | | AVANCE FISICO A DIC. DEL 2014 | MODALIDAD DE EJECUCION | ESTADO SITUACIONAL | OBSERVACIONES |
|-----------------------------|---|-------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|
| | | | | PPTO. EJECUTADO | PPTO. POR EJECUTAR | | | | |
| 7 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS SOCIALES PARTICIPATIVOS EN EL CENTRO POBLADO DE BOROGUEÑA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA | 239972 | 694,985.21 | 660,279.00 | 34,706.21 | 93.13% | ADM. DIRECTA | EN EJECUCION | |
| 8 | MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CÍVICA PRINCIPAL JORGE BASADRE GROHMAN EN EL CENTRO POBLADO DE BOROGUEÑA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA | 217968 | 508,260.42 | 487,784.00 | 20,476.42 | 79.23% | ADM. DIRECTA | EN EJECUCION | |
| 9 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DE LA LOSA DEPORTIVA DEL ANEXO DE ALTO CAMIARA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA | 268119 | 577,488.09 | 565,647.00 | 11,841.09 | 99.60% | ADM. DIRECTA | CONCLUIDA | |
| 10 | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE RECREACIÓN PASIVA Y CULTURAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LAS VILCAS, DISTRITO DE ITE, PROVINCIA JORGE BASADRE TACNA (ING. EDUARDO CUELLAR) | 290476 | 1,120,663.00 | 565,750.00 | 554,913.00 | 11.82% | ADM. DIRECTA | EN EJECUCION | |
| 11 | AMPLIACION DEL COMEDOR POPULAR VIRGEN DE COPACABANA EN EL C.P. CAMBAYA - DISTRITO DE ILABAYA | 135836 | 161,885.00 | 150,587.00 | 11,298.00 | 86.34% | ADM. DIRECTA | EN EJECUCION | |
| INFRAESTRUCTURA VIAL | | | | | | | | | |
| 12 | CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO PAMPA SITANA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE – TACNA | 169833 | 7,441,098.00 | 7,219,738.00 | 221,360.00 | | POR CONTRATA | PARALIZADA | CON INTERVENCION ECONOMICA |
| TOTAL S/. | | | 22,926,678.13 | 20,011,452.04 | 2,915,226.09 | | | | |

INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GESTION - 2015

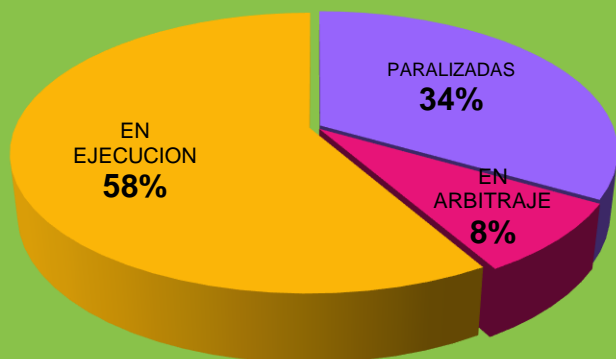

| OBRAS DE CONTINUIDAD | Nº |
|----------------------|-----------|
| PARALIZADAS | 4 |
| EN ARBITRAJE | 1 |
| EN EJECUCION | 7 |
| TOTAL | 12 |

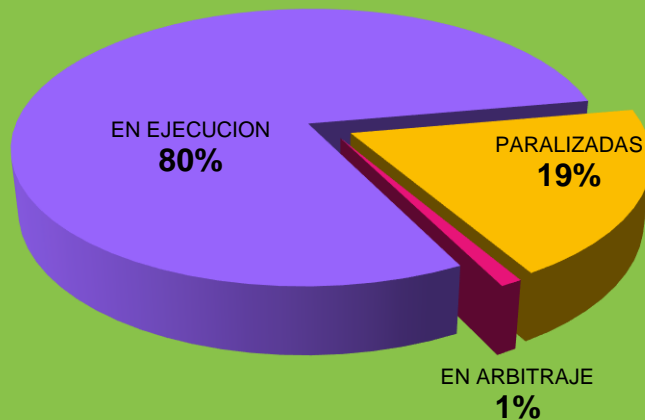

| OBRAS DE CONTINUIDAD | PRESUPUESTO S/. |
|--------------------------------|---------------------|
| PARALIZADAS | 550,058.58 |
| EN ARBITRAJE | 29,015.91 |
| EN EJECUCION | 2,270,220.69 |
| TOTAL PPTO POR EJECUTAR | 2,849,295.18 |

INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GESTION - 2015

ACCIONES REALIZADAS

INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GESTION - 2015

PROYECTOS DE CONTINUIDAD

| Nº | NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA | PROBLEMÁTICA ENCONTRADA | ACCIONES TOMADAS | AVANCES LOGRADOS |
|----|--|-------------------------|------------------|------------------|
|----|--|-------------------------|------------------|------------------|

INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| 1 | SISTEMA DE RIEGO SITANA | OBRA PARALIZADA DESDE EL AÑO 2010 POR SANEAMIENTO DEL TERRENO, LA COMPRA SE CULMINO EN EL AÑO 2014 QUEDANDO POR EJECUTAR TODAS LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES A LOS RESERVIOS DE REGULACION | TRAMITE DE APROBACION DE ADICIONAL Nº05 | R.A. DE APROBACION DE ADICIONAL PARA REINICIO DE OBRA |
| 2 | CONSTRUCCION DE DRENES Y RECUPERACION DE TIERRAS AGRICOLAS DEL VALLE DE LOCUMBA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA | EXISTE UN DESBALANCE ENTRE EL AVANCE FISICO (12.16%) Y FINANCIERO (27.10 %) POR ACOPIO DE PIEDRA EN ZONAS INACCESIBLES. EXISTE UN FALTANTE DE 5,431 GAL DE COMBUSTIBLE D2. LA RESIDENCIA ANTERIOR NO ENTREGO EQUIPO INFORMATICO ADQUIRIDO PARA LA OBRA (LAPTOP Y CAMARA DIGITAL). | SE REALIZO UN INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO. SE DESIGNO AL ING. RESIDENTE E ING. INSPECTOR PARA EL REINICIO DE LA OBRA. SE INFORMO A GERENCIA MUNICIPAL PARA EL DESLINDE DE RESPONSABILIDADES SOBRE EL COMBUSTIBLE FALTANTE Y LOS EQUIPOS NO INTERNADOS POR EL ANTERIOR RESIDENTE DE OBRA. | AVANCE FISICO AL MES DE MARZO 36.64% AVANCE FINANCIERO AL MES DE MARZO 41.05% |
| 3 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LOS CANALES SOJATA Y PEDREGAL ,DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE | EN PROCESO DE ARBITRAJE NO SE CUENTA CON DOCUMENTACION | EN PROCESO DE ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO | ----- |

SANEAMIENTO

| | | | | |
|---|--|--|-------|--------------------|
| 4 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ASENTAMIENTO HUMANO PUENTE CAMIARA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA | OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE, CON ADICIONALES 9 Y 10 Y AMPLIACION DE PLAZO Nº6 EN VIAS DE REGULARIZACION EN TRAMITE. ADICIONAL 11 EN TRAMITE PARA OPERACIÓN DE LA PLANTA COMPACTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. | ----- | ----- |
| 5 | INSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA JARDIN, DISTRITO DE ITE, PROVINCIA JORGE BASADRE TACNA | ----- | ----- | SE CULMINO LA OBRA |

INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GESTION - 2015

PROYECTOS DE CONTINUIDAD

| Nº | NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA | PROBLEMÁTICA ENCONTRADA | ACCIONES TOMADAS | AVANCES LOGRADOS |
|-----------------------------|---|---|--|--|
| RECREACION Y CULTURA | | | | |
| 6 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DEL CENTRO POBLADO BOROGUEÑA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA | OBRA CON RESOLUCIÓN DE CONTRATO Y PARTIDAS DE ACABADOS PENDIENTES DE EJECUCION | ----- | ----- |
| 7 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS SOCIALES PARTICIPATIVOS EN EL CENTRO POBLADO DE BOROGUEÑA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA | ----- | SE REINICIO LA OBRA PARA LA CULMINACION DE PARTIDAS DE PINTADO Y LIMPIEZA FINAL. ELABORACION DEL INFORME FINAL DE OBRA | SE CULMINO LA EJECUCION DE LA OBRA |
| 8 | MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CÍVICA PRINCIPAL JORGE BASADRE GROHMAN EN EL CENTRO POBLADO DE BOROGUEÑA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA | EXISTE UN DESBALANCE DE APROXIMADAMENTE 10% ENTRE EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LA OBRA | SE REINICIO LA OBRA PARA LA EJECUCION DE LAS PARTIDAS FALTANTES: JUNTAS DE DILATACION, AREAS VERDES, PERGOLAS, PINTURA Y LIMPIEZA FINAL. | ----- |
| 9 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DE LA LOSA DEPORTIVA DEL ANEXO DE ALTO CAMIARA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA | ----- | SE PROCEDIO CON LA LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA. | SE INAGURO Y ENTREGO A LA COMUNIDAD PARA SU USO. |
| 10 | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE RECREACIÓN PASIVA Y CULTURAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LAS VILCAS, DISTRITO DE ITE, PROVINCIA JORGE BASADRE TACNA (ING. EDUARDO CUELLAR) | EXISTE UN DESBALANCE ENTRE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA, ELLO DEBIDO A QUE EXISTE MATERIALEN CANCHA. EN OBRA SE VERIFICA LA PARTIDA DE CONTROL TECNICO YA QUE SE OBSERVAN FISURAS Y GRIETAS EN LOS SOBRECIMENTOS. SE TRABAJARON LAS OBRAS DE CONCRETO SIN UN DISEÑO DE MEZCLA. EXISTEN DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO EN EL DISEÑO DE MUROS DE SOSTENIMIENTO. EL GASTO EN EJECUTADO EN MANO DE OBRA (PERSONAL OBRERO) NO GUARDA PROPORCION CON EL AVANCE FISICO DE LA OBRA. SE OBSERVA QUE LOS COSTOS DE AGREGADO PAGADOS POR LA OBRA SON MUY ELEVADOS CON RESPECTO A LOS OFERTADOS POR LA MPJB. | SE REALIZO UN INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE LA EJECUCION DEL PROYECTO. SE DESIGNO AL ING. RESIDENTE E ING. INSPECTOR PARA EL REINICIO DE LA OBRA. SE HA DETERMINADO TECNICAMENTE LA RESISTENCIA ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS DE CONCRETO EJECUTADOS CON RESULTADOS NEGATIVOS. SE HAN ENCRGADO LA ELABORACION DE DISEÑOS DE MECLA PARA CONCRETO. SE HAN REDISEÑADO ALGUNAS ESTRUCTURAS DE CONCRETO. SE VIENE ANALIZANDO EL GASTO INJUSTIFICADO EN MANO DE OBRA PARA DETERMINAR RESPONSABILIDADES AL RESPECTO. SE VIENE DOCUMENTANDO EL COSTO ELEVADO DE LOS AGREGADOS A FIN DE DESLINDAR RESPONSABILIDADES. | AVANCE FISICO AL MES DE MARZO 14.53% AVANCE FINANCIERO AL MES DE MARZO 47.85% |

INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GESTION - 2015

PROYECTOS DE CONTINUIDAD

| Nº | NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA | PROBLEMÁTICA ENCONTRADA | ACCIONES TOMADAS | AVANCES LOGRADOS |
|-----------------------------|---|--|--|-----------------------------------|
| 11 | AMPLIACION DEL COMEDOR POPULAR VIRGEN DE COPACABANA EN EL C.P. CAMBAYA - DISTRITO DE ILABAYA | ----- | SE REINICIO LA OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS FALTANTES. | SE CULMINO LA OBRA EL 30.MAR.2015 |
| INFRAESTRUCTURA VIAL | | | | |
| 12 | CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO PAMPA SITANA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE – TACNA | <ul style="list-style-type: none"> - OBRA INCONCLUSA ABANDONADA POR EL CONTRATISTA. - DEFICIENCIAS TECNICAS EN LA EJECUCION FISICA DE LA OBRA. | <ul style="list-style-type: none"> - CARTA NOTARIAL Nº895 (23.FEB.2015) DE APRCIBIMIENTO PARA QUE EL CONTRATISTA CUMPLA CON SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. - SE RECOMIENDA LA RESOLUCION DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES. | ----- |

INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GESTION - 2015

AVANCES DE EJECUCION

INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GESTION - 2015

INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GESTION - 2015

116731 - Construcción de Drenes y Recuperación de Tierras Agrícolas del Valle de Locumba, Distrito de Locumba, Provincia Jorge Basadre – Tacna (EN EJECUCION)

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Incrementar la Producción agrícola en la sub cuenca del Rio Locumba, sectores Chipe, Sagollo, Chaucalana, Piñapa, Sitana y Aurora.

PROBLEMÁTICA ENCONTRADA

- ❖ Existe un desbalance entre el avance físico (12.16%) y financiero (27.10 %) por acopio de piedra en zonas inaccesibles.
- ❖ Existe un faltante de 5,431 gal de combustible d2.
- ❖ La residencia anterior no entregó equipo informático adquirido para la obra (laptop y cámara digital).

ACCIONES TOMADAS

- ❖ Se realizó informe del Estado Situacional de Proyecto.
- ❖ Se designó al Ing. Residente e Ing. Inspector para reiniciar la obra.
- ❖ Se informó a GM para el deslinde de responsabilidades sobre el combustible faltante y los equipos no internados por la anterior residencia.

| PPTO. APROBADO | 2,381,890.53 | AVANCE | AÑO 2014 | AÑO 2015 | TOTAL |
|---------------------|--------------|------------|----------|----------|--------|
| PPTO. ASIGNADO 2015 | 1,732,574.38 | FISICO | 12.16% | 22.48% | 34.64% |
| | | FINANCIERO | 27.10% | 13.95% | 41.05% |



MODALIDAD DE EJECUCION

ADM. DIRECTA

INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GESTION - 2015

**116731 - Construcción de Drenes y Recuperación de
Tierras Agrícolas del Valle de Locumba, Distrito de
Locumba, Provincia Jorge Basadre – Tacna (EN EJECUCION)**



INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GESTION - 2015

Sistema de Riego Sitana (PARALIZADA)

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Promover el uso del sistema de riego presurizado, con el fin de lograr una agricultura eficiente y competitiva en el mercado nacional e internacional, con el desarrollo de cultivos de alto rendimiento en condiciones óptimas de riego y uso de adecuadas técnicas de cultivo.

PROBLEMÁTICA ENCONTRADA

- ❖ Obra paralizada desde el año 2010 por falta de saneamiento del terreno.
- ❖ La compra del terreno se culminó en el año 2014.
- ❖ La obra no se reinició entonces por falta de disponibilidad presupuestal.
- ❖ Queda por ejecutar todas las partidas correspondientes a los reservorios de regulación.

ACCIONES TOMADAS

- ❖ Se retomó trámite de aprobación de adicional N° 05 para poder reiniciar la obra.

| PPTO. APROBADO | 3,505,959.46 | AVANCE | AÑO 2014 | AÑO 2015 | TOTAL |
|---------------------|--------------|------------|----------|----------|--------|
| PPTO. ASIGNADO 2015 | 430,608.26 | FISICO | 64.92% | 0.00% | 64.92% |
| | | FINANCIERO | 94.26% | 0.00% | 94.26% |



MODALIDAD DE EJECUCION

ADM. DIRECTA

INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GESTION - 2015

120259 - Mejoramiento de la Infraestructura de Riego de los Canales Sojata y Pedregal, Distrito De Locumba, Provincia de Jorge Basadre – Tacna (EN ARBITRAJE)

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Promover el uso del sistema de riego presurizado, con el fin de lograr una agricultura eficiente y competitiva en el mercado nacional e internacional, con el desarrollo de cultivos de alto rendimiento en condiciones óptimas de riego y uso de adecuadas técnicas de cultivo.

PROBLEMÁTICA ENCONTRADA

- ❖ En proceso de arbitraje.
- ❖ No se cuenta con la documentación de sustento.

ACCIONES TOMADAS

- ❖ Seguimiento de documentación.

| | | | | | |
|---------------------|--------------|------------|----------|----------|--------|
| PPTO. APROBADO | 1,896,851.77 | AVANCE | AÑO 2014 | AÑO 2015 | TOTAL |
| PPTO. ASIGNADO 2015 | 0.00 | FISICO | 98.00% | 0.00% | 98.00% |
| | | FINANCIERO | 98.47% | 0.00% | 98.47% |



MODALIDAD DE EJECUCION

ADM. DIRECTA

INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GESTION - 2015

OBRAS DE SANEAMIENTO

INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GESTION - 2015

77061 - Instalación del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales A.H. Puente Camiara (PARALIZADA)

OBJETIVOS DEL PROYECTO:

Bajar la incidencia de enfermedades parasitarias y gastrointestinales en el sector.

PROBLEMÁTICA ENCONTRADA

- ❖ Obra concluida físicamente.
- ❖ Adicionales 9 y 10, ampliación de plazo N°6 en vías de regularización en trámite.
- ❖ Adicional 11 en trámite para operación de la planta compacta de tratamiento de aguas residuales.

ACCIONES TOMADAS

- ❖ En proceso de elaboración y evaluación de la documentación técnica administrativa para la culminación del proyecto.

| | |
|---------------------|--------------|
| PPTO. APROBADO | 2,375,689.09 |
| PPTO. ASIGNADO 2015 | 0.00 |

| AVANCE | AÑO 2014 | AÑO 2015 | TOTAL |
|------------|----------|----------|--------|
| FISICO | 100.00% | 0.00% | 100.0% |
| FINANCIERO | 99.11% | 0.00% | 99.11% |



MODALIDAD DE EJECUCION

ADM. DIRECTA

INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GESTION - 2015

161361 - Instalación de Redes de Agua Potable y Alcantarillado en la Asociación de Vivienda Villa Jardín, Distrito de Ite, Provincia Jorge Basadre Tacna (CONCLUIDA)

OBJETIVO DEL PROYECTO:

La obra tiene por objeto la disminución de casos de diarreas y parasitosis en la asociación de vivienda villa jardín, distrito de Ite, provincia Jorge Basadre.

META FISICA DEL PROYECTO:

1. Componente I: INSTALACION DEL SISTEMA DE RED DE ALCANTARILLADO

64.23 ml de la red de alcantarillado de tubería PVC ISO de 6" y construcción de 01 buzón de concreto.

2. Componente II: INSTALACION DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE

73.65 ml de red de agua potable de tubería PVC de 2" y 09 conexiones domiciliarias c/medidor.

3. Componente III: PROGRAMA DE CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA

Realización de 03 talleres de capacitación sobre el uso apropiado y manejo de los recursos hídricos.

ACCIONES TOMADAS

- ❖ Verificación para autorización de pago de valorización de obra.

| | | | | | |
|---------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|
| PPTO. APROBADO | 90,909.44 | AVANCE | AÑO 2014 | AÑO 2015 | TOTAL |
| PPTO. ASIGNADO 2015 | 74,242.73 | FISICO | 0.00% | 100.00% | 100.0% |
| | | FINANCIERO | 17.52% | 0.00% | 17.52% |



MODALIDAD DE EJECUCION

POR CONTRATA

INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GESTION - 2015

RECREACION Y CULTURA

INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GESTION - 2015

218023 - Mejoramiento de los Servicios Municipales del Centro Poblado Borogueña, Provincia de Jorge Basadre – Tacna (PARALIZADA)

OBJETIVOS DEL PROYECTO:

Mejorar los servicios municipales del Centro Poblado Borogueña, Distrito de Ilabaya, Provincia Jorge Basadre, siendo los beneficiarios directos la comunidad en mención.

META FISICA DEL PROYECTO:

- Componente I: INFRAESTRUCTURA** Edificación de material noble de dos niveles con azotea con un área total construida de 304.70 m².
- Componente II: EQUIPAMIENTO:** Adquisición de mobiliario y equipo adecuados.
- Componente III: GESTION MUNICIPAL**
 - Acción 1.-** Elaboración de Herramientas de Gestión (MOF, ROF, TUPA y Reglamento Interno)
 - Acción 2.-** Fortalecimiento de la Gestión Institucional (Cursos Taller sobre Herramientas de Gestión)
 - Acción 3.-** Sensibilización por los Servicios Municipales (Talleres de sensibilización)

PROBLEMÁTICA ENCONTRADA

- ❖ Obra con resolución de contrato y partidas de acabados pendientes de ejecución.

| PPTO. APROBADO | 1'375,521 | AVANCE | AÑO 2014 | AÑO 2015 | TOTAL |
|---------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|
| PPTO. ASIGNADO 2015 | 0.00 | FISICO | 83.00% | 0.00% | 83.00% |
| | | FINANCIERO | 99.94% | 0.00% | 99.94% |



MODALIDAD DE EJECUCION

POR CONTRATA

INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GESTION - 2015

239972 - Mejoramiento de los Servicios Públicos Sociales Participativos en el Centro Poblado de Borogueña, Distrito de Ilabaya, Provincia de Jorge Basadre – Tacna (CONCLUIDA)

OBJETIVOS DEL PROYECTO:

Mejorar y adecuar la infraestructura para el desarrollo de las actividades públicas, sociales y participativas de los pobladores de Borogueña.

META FISICA DEL PROYECTO:

1. Componente I: INFRAESTRUCTURA

161.82 m2 de edificación de material noble de dos niveles.

2. Componente II: SUFICIENTE Y ADECUADO EQUIPAMIENTO:

Esta componente contempla la adquisición de mobiliario y equipo tecnológico necesario para la adecuada prestación de servicios públicos administrativos a la población del C.P. Borogueña.

ACCIONES TOMADAS

- ❖ Se reinició la obra para la culminación de partidas de pintado y limpieza final.
- ❖ Se viene elaborando el informe final de obra.

| PPTO. APROBADO | S/. 694,985.21 | AVANCE | AÑO 2014 | AÑO 2015 | TOTAL |
|---------------------|----------------|------------|----------|----------|---------|
| PPTO. ASIGNADO 2015 | S/. 13,500.00 | FISICO | 93.13% | 6.00% | 99.13% |
| | | FINANCIERO | 95.01% | 4.99% | 100.00% |



MODALIDAD DE EJECUCION

ADM. DIRECTA

INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GESTION - 2015

217968 - Mejoramiento de la Plaza Cívica Principal Jorge Basadre Grohman en el Centro Poblado de Borogueña, Distrito de Ilabaya, Provincia de Jorge Basadre – Tacna (EN EJECUCION)

OBJETIVOS DEL PROYECTO:

Mejorar la infraestructura de la Plaza Cívica principal Jorge Basadre Grohman del Centro Poblado de Borogueña donde sus pobladores puedan desarrollar adecuadamente sus actividades cívicas.

META FISICA DEL PROYECTO:

Construcción de plaza con pisos de adoquín en área cívica y circulaciones y pavimento de concreto en vía principal. Se equipará con pérgolas, bancas de madera e iluminación ornamental.

PROBLEMÁTICA ENCONTRADA

❖ Existe un desbalance entre el avance físico y financiero de la obra.

ACCIONES TOMADAS

❖ Se reinició la obra para la ejecución de las partidas faltantes, juntas de dilatación, áreas verdes, pérgolas, pintura y limpieza final.

| PPTO. APROBADO | S/. 508,260.42 | AVANCE | AÑO 2014 | AÑO 2015 | TOTAL |
|---------------------|----------------|------------|----------|----------|--------|
| PPTO. ASIGNADO 2015 | S/. 37,000.00 | FISICO | 74.23% | 1.42% | 75.65% |
| | | FINANCIERO | 80.19% | 2.77% | 82.96% |



MODALIDAD DE EJECUCION

ADM. DIRECTA

INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GESTION - 2015

**217968 - Mejoramiento de la Plaza Cívica Principal Jorge Basadre Grohman en el Centro Poblado de Borogueña, Distrito de Ilabaya, Provincia de Jorge Basadre – Tacna
(EN EJECUCION)**



INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GESTION - 2015

268119 - Mejoramiento de los Servicios Recreativos de la Losa Deportiva del Anexo de Alto Camiara, Distrito de Locumba, Provincia de Jorge Basadre – Tacna (CONCLUIDA)

OBJETIVOS DEL PROYECTO:

Mejorar la infraestructura de la losa deportiva del Anexo de Alto Camiara donde sus pobladores puedan desarrollar adecuadamente las actividades deportivas y de recreación.

META FISICA DEL PROYECTO:

Componente 1.- Infraestructura:

Construcción de losa deportiva, dos graderías para espectadores con cobertura para la protección de los rayos solares y la construcción de 01 batería de ss.hh. para damas y varones

Componente 2.- Equipamiento.

ACCIONES TOMADAS

- ❖ Se procedió con la limpieza final de la obra.

AVANCES LOGRADOS

- ❖ Se inauguró y entregó a la comunidad para su uso.
- ❖ Se viene elaborando el informe final de obra

| PPTO. APROBADO | S/. 532,935.00 | AVANCE | AÑO 2014 | AÑO 2015 | TOTAL |
|---------------------|----------------|------------|----------|----------|--------|
| PPTO. ASIGNADO 2015 | S/. 9,105.33 | FISICO | 99.98% | 0.00% | 99.98% |
| | | FINANCIERO | 98.02% | 1.70% | 99.72% |



MODALIDAD DE EJECUCION

ADM. DIRECTA

INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GESTION - 2015

290476 - Ampliación del Servicio de Recreación Pasiva y Cultural en el Asentamiento Humano las Vilcas, Distrito de Ite, Provincia Jorge Basadre Tacna (EN EJECUCION)

OBJETIVOS DEL PROYECTO:

Mejorar la infraestructura de la losa deportiva del Asentamiento Humano Las Vilcas del Distrito de Ite donde sus pobladores puedan desarrollar adecuadamente actividades culturales, deportivas y de recreación.

PROBLEMÁTICA ENCONTRADA

- ❖ Existe un desbalance entre la ejecución física y financiera, ello debido a que existe material en cancha.
- ❖ Se evidencia una falta de control técnico en obra ya que se observan fisuras y grietas en los sobrecimientos y no se contó con un diseño de mezcla para concreto.
- ❖ Existen deficiencias en el expediente técnico en el diseño de muros de sostenimiento.
- ❖ El gasto en ejecutado en mano de obra (personal obrero) no guarda proporción con el avance físico de la obra.
- ❖ Se observa que los costos de agregado pagados por la obra son muy elevados con respecto a los ofertados por la MPJB.

ACCIONES TOMADAS

- ❖ Se realizó un informe del estado situacional de la ejecución del proyecto.
- ❖ Se designó al Ing. residente e Ing. inspector para el reinicio de la obra.
- ❖ Se ha determinado técnicamente la resistencia estructural de los elementos de concreto ejecutados con resultados negativos.
- ❖ Se han encargado la elaboración de diseños de mezcla para concreto.
- ❖ Se han rediseñado algunas estructuras de concreto.
- ❖ Se viene analizando el gasto injustificado en mano de obra y el costo elevado de los agregados para determinar responsabilidades al respecto.

AVANCES LOGRADOS

- ❖ Se reinició la ejecución de la obra.

| PPTO. APROBADO | S/. 1'120,663.00 | AVANCE | AÑO 2014 | AÑO 2015 | TOTAL |
|---------------------|------------------|------------|----------|----------|--------|
| PPTO. ASIGNADO 2015 | S/. 537,438.37 | FISICO | 11.82% | 2.71% | 14.53% |
| | | FINANCIERO | 45.25% | 8.66% | 53.91% |



MODALIDAD DE EJECUCION

ADM. DIRECTA

INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GESTION - 2015

135836 - Ampliación del Comedor Popular Virgen de Copacabana en el C.P. Cambaya - Distrito de Ilabaya (EN EJECUCION)

OBJETIVOS DEL PROYECTO:

Ampliación de la infraestructura del comedor popular Virgen de Copacabana en el C.P. Cambaya.

META FISICA DEL PROYECTO:

- Componente I.- **INFRAESTRUCTURA:** Se refiere a 93.77 m2 de construcción del segundo nivel de material noble que estará comprendido por un Salón de Usos Múltiples, una batería de Servicios Higiénicos además de un tercer nivel para azotea de 35.25 m2.
- Componente II.- **EQUIPAMIENTO:** Adquisición de equipamiento y mobiliario necesario para la adecuada prestación de servicios.

ACCIONES TOMADAS

- ❖ Se reinició la obra para la ejecución de las partidas faltantes.
- ❖ Se viene elaborando el informe final de obra.

| PPTO. APROBADO | S/. 161,885.00 | AVANCE | AÑO 2014 | AÑO 2015 | TOTAL |
|---------------------|----------------|------------|----------|----------|---------|
| PPTO. ASIGNADO 2015 | S/. 11,000.00 | FISICO | 86.34% | 13.66% | 100.00% |
| | | FINANCIERO | 93.02% | 6.98% | 100.00% |



MODALIDAD DE EJECUCION

ADM. DIRECTA

INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GESTION - 2015

INFRAESTRUCTURA VIAL

INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GESTION - 2015

169833 - Construcción De Pistas Y Veredas En El Asentamiento Humano Pampa Sitana, Distrito De Locumba, Provincia Jorge Basadre – Tacna (PARALIZADA)

OBJETIVOS DEL PROYECTO:

Brindar Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en las avenidas y calles del Asentamiento Humano Pampa Sitana.

META FISICA DEL PROYECTO:

1. Componente I.- **CALLES CON VEREDAS ADECUADAS:** Se refiere a la construcción de veredas de concreto en ambos lados de las vías.
2. Componente II.- **CALLES CON CALZADAS ADECUADAS:** Las superficies de rodadura serán de carpeta asfáltica de 2" y las bermas con tratamiento monocapa.
3. Componente III.- **SEÑALIZACION:** horizontal y vertical según reglamento

PROBLEMÁTICA ENCONTRADA

- ❖ Obra inconclusa abandonada por el contratista. D
- ❖ Deficiencias técnicas en la ejecución física de la obra

PROBLEMÁTICA ENCONTRADA

- ❖ Carta notarial n°895 (23.feb.2015) de apercibimiento para que el contratista cumpla con sus obligaciones contractuales.
- ❖ Se recomienda la resolución del contrato por incumplimiento de obligaciones contractuales.

| PPTO. APROBADO | S/. 7'441,098.00 | AVANCE | AÑO 2014 | AÑO 2015 | TOTAL |
|---------------------|------------------|------------|----------|----------|--------|
| PPTO. ASIGNADO 2015 | S/. 0.00 | FISICO | 98.51% | 0.00% | 98.51% |
| | | FINANCIERO | 91.23% | 0.00% | 91.23% |



MODALIDAD DE EJECUCION

POR CONTRATA

INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GESTION - 2015

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GESTION - 2015

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EJECUTADAS 2011 - 2014

INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GESTION - 2015


ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EJECUTADAS POR LA GDTI 2011 - 2014

| Nº | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | PRESUPUESTO EJECUTADO (S/.) | | | | | MODALIDAD DE EJECUCION |
|------------------|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | TOTAL | |
| 1 | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA | 822,999.00 | 764,131.38 | 1,278,758.46 | 1,144,050.00 | 4,009,938.84 | ADM. DIRECTA |
| 2 | MANTENIMIENTO DE VIAS | 700,000.00 | 0.00 | 687,457.98 | 0.00 | 1,387,457.98 | ADM. DIRECTA |
| 3 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES | 915,000.00 | 1,347,458.26 | 1,009,108.92 | 946,800.00 | 4,218,367.18 | ADM. DIRECTA |
| 4 | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO | 0.00 | 1,067,581.56 | 784,227.57 | 1,052,000.00 | 2,903,809.13 | ADM. DIRECTA |
| 5 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAUCE DEL RIO LCUMBA | 581,514.57 | 868,332.53 | 823,416.72 | 773,565.86 | 3,046,829.68 | ADM. DIRECTA |
| 6 | MANTENIMIENTO DEL CAUCE DEL RIO LOCUMBA EN PUNTOS CRITICOS COMO UNA MEDIDA DE CONTINGENCIA ANTE EL INCREMENTO DEL CAUDAL | 0.00 | 593,831.00 | 446,688.06 | 0.00 | 1,040,519.06 | ADM. DIRECTA |
| 7 | MANTENIMIENTO DEL CAUCE DEL RIO CINTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340,824.48 | 340,824.48 | ADM. DIRECTA |
| TOTAL S/. | | 3,019,513.57 | 4,641,334.73 | 5,029,657.71 | 3,916,415.86 | 16,947,746.35 | |

INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GESTION - 2015

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO EJECUTADO POR LA GDTI POR ACTIVIDAD 2011 - 2014


| ACTIVIDAD | MONTO DE INVERSION S/. |
|--|------------------------|
| MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA | 4,009,938.84 |
| MANTENIMIENTO DE VIAS | 1,387,457.98 |
| MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES | 4,218,367.18 |
| MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO | 2,903,809.13 |
| MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAUCE DEL RIO LCUMBA | 3,046,829.68 |
| MANTENIMIENTO DEL CAUCE DEL RIO LOCUMBA EN PUNTOS CRITICOS COMO UNA MEDIDA DE CONTINGENCIA ANTE EL INCREMENTO DEL CAUDAL | 1,040,519.06 |
| MANTENIMIENTO DEL CAUCE DEL RIO CINTO | 340,824.48 |
| TOTAL S/. | 16,947,746.35 |

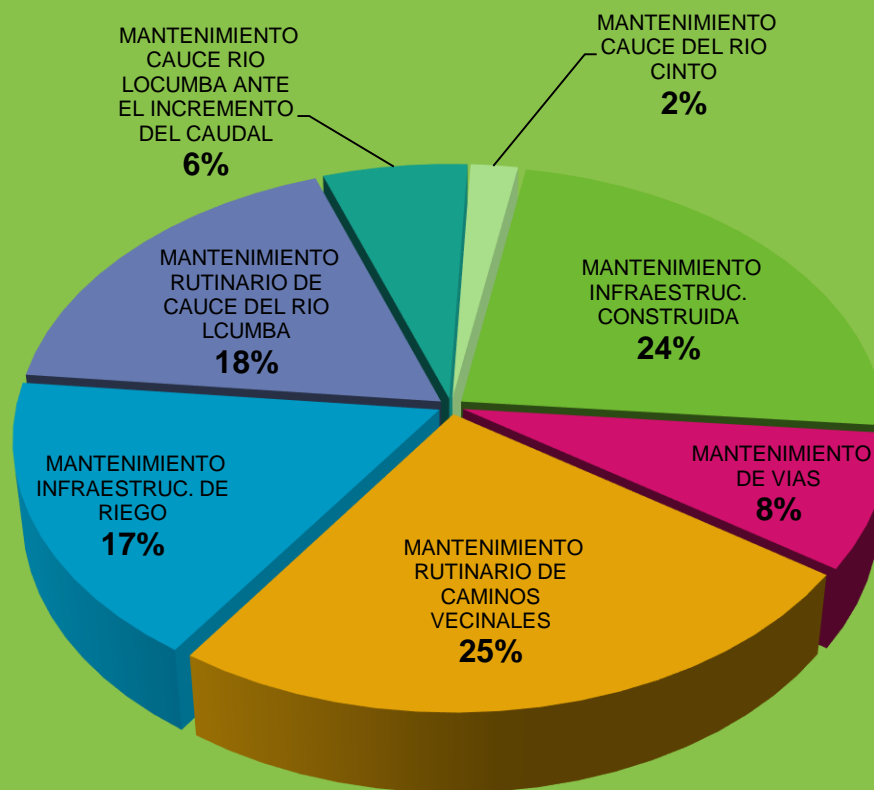

INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GESTION - 2015

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO EJECUTADO POR LA GDTI POR AÑO 2011 - 2014

| AÑO | MONTO DE INVERSION S/. |
|------------------|---------------------------|
| AÑO 2011 | 3,019,513.57 |
| AÑO 2012 | 4,641,334.73 |
| AÑO 2013 | 5,029,657.71 |
| AÑO 2014 | 4,257,240.34 |
| TOTAL S/. | 16,947,746.35 |

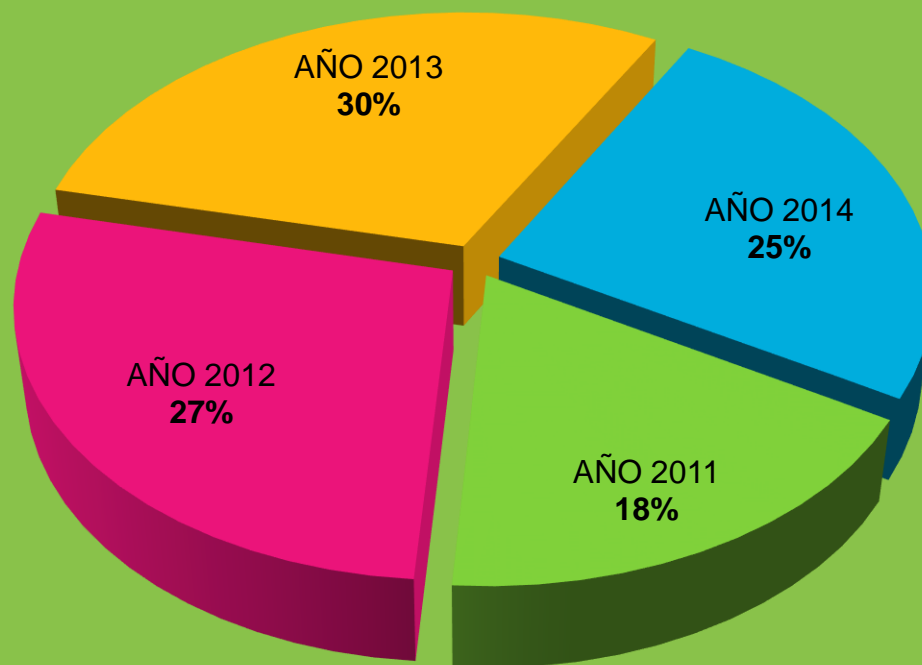

INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GESTION - 2015

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN EJECUCION

INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GESTION - 2015

Mantenimiento periódico de vías 2015

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

Preservar las inversiones efectuadas en el mantenimiento de la vía.

Garantizar la transitabilidad permanente para que los usuarios puedan circular diariamente por las vías, es decir, que las interrupciones para su movilización sean mínimas durante el año.

META FISICA DE LA ACTIVIDAD

Para el cumplimiento de los objetivos del plan de trabajo se tiene programado realizar las siguientes actividades:

1. 01 trabajos preliminares
2. 01.01 movilización de personal, equipos y herramientas
3. 01.02 movilización y desmovilización de maquinaria
4. 01.03 trazo y replanteo
5. 02 corrección de plataforma en puntos críticos
6. 02.01 limpieza manual de bermas y desbroces
7. 03 conservación de calzada
8. 03.01 perfilado de la vía con maquinaria
9. 04 transporte
10. 04.01 eliminación de material excedente c/maquinaria
11. 05 seguridad y salud ocupacional
12. 05.01 equipos protección personal
13. 06 mitigación de impacto ambiental
14. 06.01 mitigación ambiental por presencia de material particulado.

ESTADO

PPTO. ASIGNADO
2015

% DE AVANCE
FISICO 2015

En
Ejecución

S/. 74 614.61

81.26%



INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GESTION - 2015

Mantenimiento encauzamiento del río locumba sectores aurora y cocotea

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

Protección del río Locumba a consecuencia de las descargas hídricas.

Protección del sector que se encuentra afectado a orillas del cauce del río Locumba, debido a las precipitaciones en la parte alta de la Cuenca de Locumba que generan incremento en el caudal del río Locumba.

META FISICA DE LA ACTIVIDAD

- Obras Provisionales:** Cartel de Identificación de la Obra de 2.40x3.60 m. con gigantografía. Movilización y Desmovilización de Maquinaria y Equipos.
- Trabajos Preliminares:** Limpieza y desbroce de vegetación existente en áreas a intervenir.
- Movimiento de Tierras:** Corte y remoción de sedimentos existentes en cauce del río c/tractor. Corte y limpieza de drenes existentes c/retroexcavadora.
- Mitigación de Impacto Ambiental:** Medidas de Mitigación de Impacto Ambiental

ESTADO

PPTO. ASIGNADO
2015

% DE AVANCE
FISICO 2015

En
Ejecución

S/. 64 609.72

96.68%



INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GESTION - 2015

Mantenimiento del estadio municipal Jorge Pinto Liendo del distrito de Locumba provincia Jorge Basadre - Tacna

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

Mejorar la calidad de los servicios para el desarrollo de la comunidad.

Realizar el mantenimiento del estadio municipal mediante mejoramiento de las graderías, ss.hh, cerco perimétrico, boletería y áreas libres.

Mejorar las áreas deportivas que no cumplen con los requerimientos para la adecuada práctica de deporte.

META FISICA DE LA ACTIVIDAD

El plan de trabajo básicamente comprende la realización de las siguientes actividades:

1. MANTENIMIENTO DE GRADERIAS
2. MANTENIMIENTO DE CERCO PERIMETRICO
3. MANTENIMIENTO DE SS.HH
4. MANTENIMIENTO DE BOLETERIA
5. OTROS

ESTADO

PPTO. ASIGNADO
2015

% DE AVANCE
FISICO 2015

En
Ejecución

S/. 197 884.64

22.56%



INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GESTION - 2015

Mantenimiento Del Estadio Municipal Jorge Pinto Liendo Del Distrito De Locumba Provincia Jorge Basadre - Tacna



INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GESTION - 2015

OTRA PROBLEMÁTICA

Otra Problemática

- 1. Carretera Locumba – Margarata**
- 2. Canales de Riego**
- 3. Sistemas de Riego Tecnificado**
- 4. Sistema de Agua Potable Puente
Camiara – Pampa Sitana**

Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura

**INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS
PRIMEROS 100 DIAS DE GESTION - 2015**



¡GRACIAS!
